

KAVERI KALA MANRAM

காவேரி கலா மன்றம்

2020

HOUSING PROJECT PROJECT COMPLETION REPORT

| Description detail | Description | | | |
|--|--|--|--|--|
| Date of Proposal | 23 th December 2020 | | | |
| திட்ட முன்வைப்பு திகதி | | | | |
| Project identified date & identifier முன்வைப்பாளர் | KKM project team | | | |
| Kind of Project திட்டத்தின் வகை | Housing project | | | |
| Date of work start வேலை தொடங்கும் திகதி | 26 th December 2020 | | | |
| Date of project completion வேலை முடிவடையும் திகதி | End of January 2021 | | | |
| Date of reporting அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் திகதி | 01 st March 2021 | | | |
| Date of final cheque payment கடைசி காசோலை வழங்கும் திகதி | 26 th February 2021 | | | |
| Name of the beneficiary பயனாளியின் பெயர் | Mr.Sisira Karunarathna | | | |
| Age of the beneficiary വധത്നണിധിன് ഖധத്വ | 29 Years | | | |
| NIC Number/ National Authorization தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம் | 912224597V | | | |
| Address விலாசம் | Ihalagoonewa, Thambiyawa, Thanthirimale, Anurathapuram | | | |
| T.P number தொலைபேசி இலக்கம் | - | | | |
| Number of benefiters பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை | 04 | | | |
| Inventory number பொருள் கொள்வனவு இருப்பு | NA | | | |
| KKM objective காவேரி கலாமன்றத்தின் நோக்கம் | | | | |
| Project Proposal Code Number | KKM/PPN/2021/01 | | | |
| Implementation process செயல் திட்ட நடைமுறை | Home visits requested by Government and beneficiaries. Collect information. Proposal Implement project Submit report Continues support for five years in encouraging, empowering, conducting local exhibition to be independent | | | |
| Family or project background குடும்ப மற்றும் திட்ட பின்னணி | I am Mr.Sisira Karunarathna living with my family. I have a son and he is school going child. I am 29 years old. My wife & my mother are helping me to do farming, and I am a laborer. My | | | |

| | mother also a labor. I am affected by Leprosy since 2019. We are live in Temporary mud house, if you give this housing project to us we will in a peaceful and live a safety life, My family and I will be really great full to you for your generous support. Thanking you. |
|---|--|
| Challenges of beneficiary பயனாளியின் சவால்கள் | Unable to afford the cost, due to poverty |
| Community involvement / Beneficiary involvement சமுக மந்நும் பயனாளியின் ஈடுபாடு | NA |
| Use and maintenance தொடர் முகாமைத்துவம் | It will be maintained and used by Mr.Sisira Karunarathna family and Staff Of KKM Will be Supporting & monitoring the Project Continuously. |
| Risk description திட்டம் எதிர் கொள்ளும் ஆபத்து | Unable to contact beneficiary, weather condition, estimation of materials in price range. |
| Risk Management ஆபத்தை முகாமைத்துவம் செய்வது | Contact beneficiary ahead of time, order materials on time. Check weather forecast. Work with field officer. |
| Total fund request from KKM நிதி கோரிக்கை | The estimated cost required is 402,262.00 rupees |
| Total beneficiary contribution through their man power பயனாளியின் பங்களிப்பு | The beneficiary will take care of the extra cost. |
| Total Estimated மொத்த பாதீடு | The estimated cost is 402,262.00 rupees |




KKM- Estimated budget & Spent

Project (திட்டம்): Housing project


Total Budget (பாதீட்டு மொத்தம்) : 366,682.00 Total Spent (பாதீட்டு செலவு) : 402,262.00

| | All figures in SL | Unit | Unit Cost | Quantity | Total estimated | Spent |
|-----|------------------------------------|--------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Α | Materials (பொருட்கள்) | | | | | |
| A1 | Foundation work | | 8500.00 | 1½ lord | 12,750.00 | 16,750.00 |
| A2 | Sand | 1qr | 7000.00 | 4 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| A3 | 12 mm Wire | 1 bags | 600.00 | 6 bags | 3,600.00 | 3,600.00 |
| A4 | Cement | bags | 1100.00 | 24 bags | 26,400.00 | 36,400.00 |
| A5 | Creaser stone | 1qr | | | 10,000.00 | 16,000.00 |
| A6 | Roof tiles | 1 | 66.00 | 550 | 36,300.00 | 43,300.00 |
| A7 | Head Roof tiles | 1 | 95.00 | 22 | 2,090.00 | 2,620.00 |
| A8 | Cement brick stone | 1 | 38.00 | 1500 | 57,000.00 | 57,000.00 |
| A9 | Nail | 1kg | 250.00 | 10kg | 2,500.00 | 2,500.00 |
| A10 | Wood for roof -01 | 1 | 700.00 | 24 | 16,800.00 | 16,800.00 |
| A11 | Wood for roof -02 | 1 | 155.00 | 44 | 6,820.00 | 6,000.00 |
| A12 | Wood for roof -03 | 1 | 165.00 | 22 | 3,630.00 | 5,400.00 |
| A13 | Wood for roof -04 | 1 | 20.00 | 600 | 12,000.00 | 9,000.00 |
| A14 | Doors set | 2 set | | | 13,000.00 | 13,000.00 |
| A15 | Windows set | 2 set | | | 12,000.00 | 6,000.00 |
| A16 | Mason charge | | | | 40,000.00 | 48,000.00 |
| A17 | Carpenter charge | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| A18 | Local Transept | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| A19 | Implement charge | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| A20 | Name board | | | | 1,300.00 | 1,300.00 |
| A21 | Electric wiring with labor charges | | | | 15,050.00 | 23,150.00 |
| A22 | Kitchen utensils | | | | 8,500.00 | 8,500.00 |
| В | Subtotal cost (கூட்டுத்தொகை) | | | | 349,740.00 | 385,320.00 |
| С | Project cost (திட்டகட்டணம்) | | | | 16,942.00 | 16,942.00 |
| D | Total Cost (மொத்தக்கட்டணம்) | | | | 366,682.00 | 402,262.00 |

BILLS

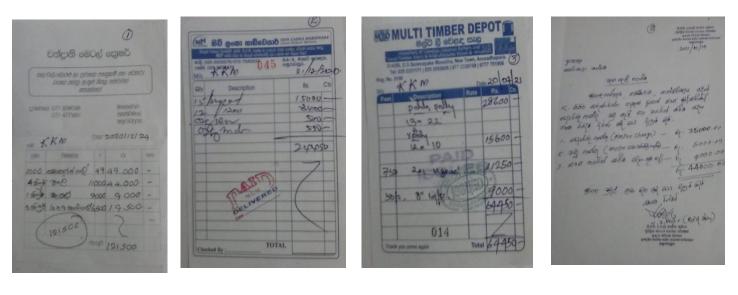


















PHOTOS





THANKS LETTER

K. Estab soboderbarbar grove another, 2555.0 and ablaced, 2021/02/18. garage. 326ac, 20168, තිබය මද්කරදීම නිවැද කිතුරාය නිකාශක්රීම 6. m. good 912224597V 2603 200 ma en Esna sand a Cizie obsona asem 300006 ezos geosdo. In outer 30 805, 250 songeast again an appartent pad entad තෙත්තේ ඇති කියෙක් තරීමෙක අති අතුත්තී මාන්තම ආතිමකමර මීත්ත්තම ලාපුණි රෝහාන් ක්ෂාන්ත රාන්තමේ abde staden man eager slaper agent agent East askare antes adames 923 mers as 1022 92,260,00 02. 086 0640000 80 5553 1022 000,000 700,000 700,000 80,000 000 1000 1022 000,000 700,000 80,000 90 000 10258 10242 000,000 000 70 000 10258 alayaba (sansosab 588 and Stad 586
