



KAVERI KALA MANRAM

2020

Sanitation project



Project Completion Report

Sponsored By

Saiva Manram – Sydney Murugan Temple (Aus)

Project detail (திட்ட விபரம்)

Description detail	Description
Date of Proposal திட்ட முன்வைப்பு திகதி	03 th February .2020
Project identified date & identifier முன்வைப்பாளர்	KKM Vanni Hope team
Kind of Project திட்டத்தின் வகை	Sanitation project
Name of the beneficiary பயனாளியின் பெயர்	Ketheeshwaran Thanustan
Age of the beneficiary பயனாளியின் வயது	14years
NIC Number/ National Authorization தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம்	886574096V mother NIC No
Address விலாசம்	Selvanagar, Batticaloa.
Number of benefiter பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை	05
KKM objective காவேரி கலாமன்றத்தின் நோக்கம்	Make good accesses to get quality water & sanitation for health & hygienic life.
Recommendation letter Code Number உறுதிப்படுத்தல் கடித இலக்கம்	KKM/LB/ 2020
Land ownership காணி உறுதிப் பத்திர இலக்கம்	B549/133
Poverty line survey வறுமை அளவீட்டு மதிப்பீடு	45%
Implementation process செயல் திட்ட நடைமுறை	<ul style="list-style-type: none"> • Home visits requested by Government and beneficiaries. • Collect information. • Proposal • Implement project • Submit report
Family or project background குடும்ப மற்றும் திட்ட பின்னணி	<p>Thanustan living in Aryampathy, Batticalo with 2 siblings and parents. Thanustsn is 14 years old, is a Leprosy patient, and on treatment now.</p> <p>His Father is a daily labor worker. They have no toilet facility at home. They need a toilet for their health and hygiene.</p>
Challenges of beneficiary பயனாளியின் சவால்கள்	There is no proper sanitation facility by the poverty circumstances.
Project sustainability திட்டத்தை சுயநிலைப்படுத்தல்	Safety and sanitary
Community involvement / Beneficiary involvement சமூக மற்றும் பயனாளியின் ஈடுபாடு	Keep the toilet clean
Use and maintenance தொடர் முகாமைத்துவம்	This facility will be maintained and used by and the Family Members
Total beneficiary contribution through their man power பயனாளியின் பங்களிப்பு	The beneficiary will take care of the extra cost.
Total spent மொத்த செலவு	82,549.00



Kaveri Kala Manram

Project financial progressing report with authorization

Name of the project	Sanitation project	
Project analyzing date	End of February	
Proposal submitted date	03th February .2020	
Project start date	15th February2020	
Project completion date	06th July 2020	
Total project beneficiaries	05	
Estimated budget as mention in proposal	77,138.00	
Funding from donor	Saiva Manram	82,549.00
Actual spent for project	82,549.00	
Current funding status	No balance	
Project sponsors	Saiva Manram – Sydney Murugan Temple , Australia	
Donation receipt No	Saiva Manram	
Payment Cheque No	Cheque No	Amount
	434081	73,650.00
	434080	1,300.00
	434098	7,599.00
	Total spent	82,549.00
Vouchers No	14,15	
Project approved by	Mr. S Puththisigamani, Treasurer, Kaveri Kala Manram.	
Implemented by	Mrs.J.Nishanthini Miss.P.Uthayashanthini Mrs.A.Ketheeshwary	
Reporting status	-	
Reporting by	Miss.P.Uthayashanthini Kaveri Kala Manram Reporting Unit	
Account authorized by	Mrs.A.Thayalini	
Reporting submitted to	Saiva Manram Vanni Hope Members of the executive committee of KKM.	
KKM Video reporting	https://www.youtube.com/watch?v=ZtAac5b_gmA	
Reporting in KKM Website (http://kaverikalamandram-kkm.org/last/KKM%202020%20projects.html)	SP/08	

Authorized by Miss.T.Shahana
Administrative officer,
Kaveri Kala Manram



KKM vanni hope - Estimated budget

காவேரி கலா மன்றம் பாதீடு

	All figures in SL	Unit	Unit Cost	Total estimated	Total spent	Bill number
A	Materials (பொருட்கள்)					
A1	Cement		1,080.00	8,579.00	10,000.00	002824
A2	Creaser stone (Land master)		2,000.00	2,000.00	2,500.00	002824
A3	Sheet		1350.00	2,700.00	-	
A4	Wood board		650.00	1,300.00	-	
A5	Spring Nut		500.00		500.00	002824
A6	Seat nail		200.00	200.00		
A7	PVC Pipe 4' (06feet)		420.00	420.00	1,500.00	002824
A8	PVC Pipe 1' (06feet)		140.00	140.0	1,500.00	002824
A9	Paint Think		25,00.00	25,00.00	750.00	002824
A10	Sand		5,000.00	5,000.00	7,000.00	002824
A11	Basin		2,000.00		2,000.00	002824
A12	4" Cement stone		40.00	18,000.00	14,400.00	002824
A13	Foundation stone		4,000.00	4,000.00	4,000.00	002824
A14	Name board		1,200.00	1,200.00	1300.00	-
A15	Door		4,000.00		4,500.00	002824
B1	Meson			23,000.00	20,000.00	
C1	Transport			3,000.00	5,000.00	
E	Subtotal cost (கூட்டுத்தொகை)			69,539.00	74950.00	
F	Project cost (திட்ட கட்டணம்)			7,599.00	7,599.00	
G	Total Cost (மொத்தக்கட்டணம்)			77,138.00	82,549.00	

Account authorizer


A. K. K. K.



Spent bills (செலவு விபரம்)



Handwritten notes on a separate sheet of paper, including the word 'Arham' and other illegible text.

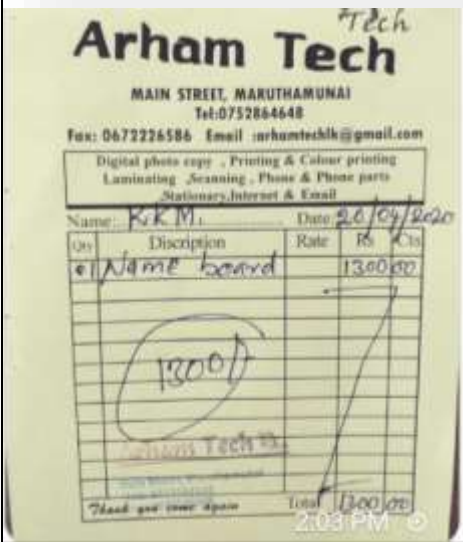

Project Photos - (புகைப் படங்கள்)



Beneficiary Thanks Letter (நன்றிக்கடிதம்)

K. குணசீரன்,
திருவாய் பதி,
மட்டக்களப்பு,
15/06/2020.

சைவமன்றம்
பிடாரி இலகன் ரெப்பிள்

நன்றி கூறல் தொடர்பானது

மேற்கூறிய அலாசத்தில் வசிக்கும் நான்
ஆகவே எனக்கு அது குடும்பத்திற்கும் துணை
செய்ய தொடக்கப்பட்ட மலல கூடம்
கடைக்கூப்பற்றிய அம் வேலைத் திட்டம்
குறித்து எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி இவ்
செயற்பாட்டானது எனக்கு மிகவும் பயனுடையது
எனக்கு இவ் செயற்றிடத்தை செய்கி தந்த
சைவமன்றம் மற்றும் காலேரி கவர் மன்றத்திற்கு
எனது மனமார்ந்த நன்றிகள்

சிறக்கணம்
ம. அபிஷேகன்
8865740960
