

KAVERI KALA MANRAM

காவேரி கலா மன்றம் 2022 PROJECT COMPLETION REPORT

- A. Proposal
- B. Estimated budget
- C. Attachments
 - a. Request letter beneficiary
 - b. Confirm letter with PHI
 - c. NIC photo copy

Description detail	Description			
Date of Proposal	27.01.2022			
திட்ட முன்வைப்பு திகதி	21.01.2022			
Project identified date & identifier	KKM project team			
முன்வைப்பாளர்	reservit project team			
Kind of Project	Water for livelihood project			
திட்டத்தின் வகை	The state of the s			
Date of work start வேலை தொடங்கும் திகதி	31.01.2022			
Date of project completion				
போட் படிப்பட்ட விரும்	02.01.2022			
Date of reporting	22.21.22.2			
அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் திகதி	03.01.2022			
Date of final cheque payment	02 01 2022			
கடைசி காசோலை வழங்கும் திகதி	03.01.2022			
Name of the beneficiary	A.Surangani			
பயனாளியின் பெயர்	A.Surangani			
Age of the beneficiary	41			
பயனாளியின் வயது				
NIC Number/ National Authorization	198163504488			
தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம் Address				
Address விலாசம்	Sathugama, Anurathapura			
T.P number				
தொலைபேசி இலக்கம்	-			
Number of benefiters	06			
பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை	06			
Inventory number	NA			
பொருள் கொள்வனவு இருப்பு				
	Water is essential for livelihood as well as for cultivation for			
	short term and long term crops. The main objective of KKM			
KKM objective	&AED is to guide the beneficiary to have an income from short			
KKM objective	term and long term crops. For short term they are encouraged to			
	plant papaya and passion fruit, and for long term benefit, banana			
	and coconut tree. They are also encouraged to grow other			
	vegetables such as eggplant, tomatoes, spinach etc.			
Project Proposal Code Number	KKM/A22/001			
	• Home visits requested by Government and beneficiaries.			
	• Collect information.			
Implementation process செயல் திட்ட நடைமுறை	• Proposal			
	• Implement project			
	Submit report			
	• Continues support for five years in encouraging, empowering,			
	conducting local exhibition to be independent			
Family or project background				
குடும்ப [்] மற்றும் திட்ட பின்னணி	S.Vijerathna lives in sandaresgama, Epawala, Anurathapura.			

Challenges of beneficiary	At present he is tending to a garden on someone else's land as he			
பயனாளியின் சவால்கள்	has no water facility on his own land.			
Community involvement / Beneficiary	Local masons and tube well contractors will build the well. The			
	family will also help the masons during construction with			
involvement	excavation. KKM field staff will supervise the construction of			
சமுக மற்றும் பயனாளியின் ஈடுபாடு	the well.			
Use and maintenance தொடர் முகாமைத்துவம்	It will be maintained and used by Mr.Vijerathnafamily and Staff			
	Of KKM Will be Supporting & monitoring the Project			
	Continuously.			
Risk description	Unable to contact beneficiary, weather condition, estimation of			
திட்டம் எதிர் கொள்ளும் ஆபத்து	materials in price range.			
Risk Management	Contact beneficiary ahead of time, order materials on time. Check			
ஆபத்தை முகாமைத்துவம் செய்வது	weather forecast. Work with field officer.			
Total fund request from KKM	The estimated cost required is 38,901.50 rupees			
நிதி கோரிக்கை	The estimated cost required is 30,701.30 tupees			
Total beneficiary contribution through their				
man power	The beneficiary will take care of the extra cost.			
பயனாளியின் பங்களிப்பு				
Total Estimated	The estimated cost is 38,901.50 rupees			
மொத்த பாதீடு	The estimated cost is 30,701.30 Tupees			

KKM- Estimated budget காவேரி கலா மன்றம் பாதீடு

Project (திட்டம்): Water for livelihood project Budget Period (பாதீட்டு காலம்):One month

Budget Currency SL (பாதீட்டு நாணயம்) :Rs. 38,901.50

Total Budget (பாதீட்டு மொத்தம்) : 38,901.50

All figures in SL	Unit	Unit Cost	Quantity	Budget	Spent
Water pump & Pipe				27615.00	34170.00
line	01	27615.00			
Name board	01	1750.00		1750.00	1750.00
Water tank building				3000.00	3000.00
work	01	3000.00			
implement charge				3000.00	3000.00
Subtotal cost				35,365.00	41,920.00
Admin cost				3536.50	3536.50
Total Cost				38,901.50	45,456.50

Request letter beneficiary (பயனாளியின் திட்ட முன்வைப்புக்கடிதம்)

A.M क्षिठक के मुकारारि वेट्ट किश्रुष्ट නිර්තිරිකාගම Quedos අතාගතම 2022/1/22 කුවරි කලා බන්පාරි ප්ල නොවරයන් ලබා ගැනිම සෑ භ からろう の対 30m 198163504498 そかか か Emo ලදුරු භෝගයේග් පෙලෙන භෝගියෙන්. එ සදහ න වා අතදිත තත්වාය්ත්දිපපතේ කාම කිරීමට හා කාශ් ඇයි මේ 30 වල නාවපයන් පහලෙන බැවින්. ඉපත් නිවස් ළිදු අතත් තානල ජල නොවර්යක් නොවලා නැතින් හොමල වා ගවයා වශ් පෙර ගැනීමට අවනපුග ප නිලින් මා ගව වතුර ලොවර ශ්ෂ ලකා වෙන ලෙන ලින කාර්ගිකව €38. 000 00000


Conformation letter PHI (உறுதிபடுத்தல் கடிதம்)

A.M. Surangani Adikari (Recompidation tetter) පරිසාලන මහසන කෙරෙන පරික්ෂක. ලාදුරු පර්ධන ඒකකය. පුලේශීය ගෙමෙන සේවා අය සම සා ව්යාලය, and Dec. 2022/01/20. dinam's. කචරිකලා මන්රම ජල මෙරටරයක් ලබාදීම සුදුසු බවට නිර්මද්ශය අලුත්තර, මර්පිට්යාගම අතනුත්ගම යන එපිනයේ පදිංචි ජා. කැ.අංක 198163504498 දරණ A.M.කුරායන් අධිකාරි නො අය ලාදුරු රෝගය සදහා දඹුල්ල මහ රෝහලේ සමේ රෝග සායනයෙන් පුතිකාර ලබා ගන්නා අයෙකි. හොවිකැන ජනියාව කරගත් ඇය කථාකිරීමේ හා කන් ඇසීමේ ආඛාධයකින් පෙලේ. අව්වාහක වන අතර මව සමග ජීවත්වේ. ඉහාමත් ආර්ථික දුන්කරකටලින් පෙලෙන කුලිවැඩ කරමින් එදිනෙදා විශදම කොයා තති. ඇයගේ ගෙවන්නේ ලිදුන් ඇතිමුත් ජලය ලබාගැනීමේ අපහසුතාවයක් පවසී. එබැවින් වතුර පොරවයක් ලපාදම යුදුයු බව නිර්දේශ කරමි. පරිසාලන වෙස්ව නොගෙ පරිස්ත ලදුරු මර්ඛන ඒකකය. අතුරාධපුරය

NIC photo copy (தேசிய அடையாள அட்டை போட்டோ பிரதி)




Thanking Letter

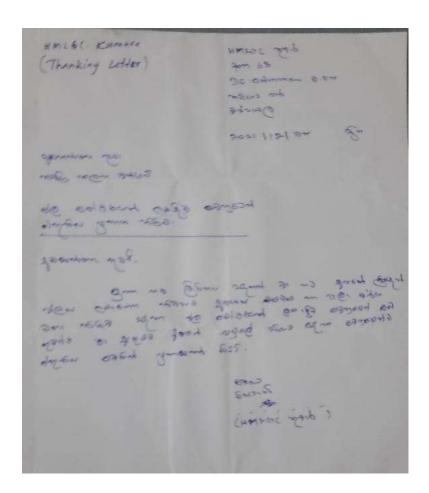







Photo





